

सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको आ.व. २०८१/०८२ को बजेट कार्यान्वयनको बार्षिक समिक्षात्मक कार्यक्रमको प्रस्तुती

(मिति: २०८२ भाद्र ८ गते)

(स्थान: सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको सभाहल, विराटचोक, मोरङ)

विनोद कुमार न्यौपाने

(प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत)

विवरण प्रस्तुतकर्ता

संजीव पौड्याल

(योजना तथा अनुगमन - अधिकृत)


सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको नक्सा



"सुन्दरहरैँचा, विकासको बगैँचा"



सुन्दरहरैँचा नगरपालिका को भौगोलिक नक्सा

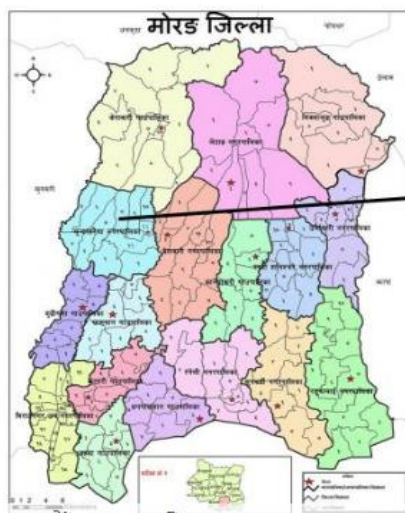

सुन्दरहरैँचा नगरपालिका



परिचय

- ▶ मिति २०७३ साल फाल्गुण २७ गतेको नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको गठन भएको हो ।
- ▶ साविक कोशीहरैँचा नगरपालिका (साविकका गाँउ विकास समितिहरु:- इन्द्रपुर, हरैँचा र मृगौलिया) र साविक सुन्दरदुलारी नगरपालिका (साविकका गाँउ विकास समितिहरु:- दुलारी र सुन्दरपुर) समायोजन भई सुन्दरहरैँचा नगरपालिका निर्माण भएको हो ।

भौगोलिक अवस्थिति:-

- ▶ यस नगरपालिकामा १२ वटा वडाहरु रहेका छन्,
- ▶ उत्तरी अक्षांश:- २६.६६ डिग्री
- ▶ पूर्विय देशान्तर:- ८७.३८ डिग्रीमा अवस्थित रहेको,
- ▶ क्षेत्रफल ११०.१६ बर्ग कि.मी. मा फैलिएको,
- ▶ कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरबाट १९ कि.मी. उत्तर तर्फ रहेकोछ,
- ▶ उचाई:- समुन्द्र सतह देखि ८३ मिटर देखि १४० मिटर सम्म रहेको,

सिमाना:

- ▶ पूर्व:- बेलबारी नगरपालिका
- ▶ उत्तर:- केराबारी गाउँपालिका
- ▶ पश्चिम:- इटहरी उप-महानगरपालिका
- ▶ दक्षिण:- ग्रामथान गाउँपालिका र बुढी गंगा गाउँपालिका

जनसंख्या (वि.सं. २०७८ अनुसार)

- कुल जनसंख्या: १,२०,२१३
- महिलाको संख्या: ६३,२३२
- पुरुषको संख्या: ५६,९८१
- घरधुरी संख्या: २९,८२६

महत्वपूर्ण पर्यटकिय स्थलहरू तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणः

- ▶ वडा नं. १ मा रहेको किचकगढी
- ▶ वडा नं. ३ मा रहेको शेषनारायण धाम
- ▶ वडा नं. ५ मा रहेको हसिना सिमसार (४९ हेक्टरमा फैलिएको)
- ▶ वडा नं. ५ मा रहेको नयाँ बृन्दावन गौशला (सुरुमा ४ कठ्ठाबाट निर्माण शुरू गरिएको यो धार्मिक स्थल अहिले ७ बिघा भन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको, प्रमुख आकर्षणः- विश्वकै अग्लो/ठुलो गाईको प्रतिमा रहेको तथा राधाकृष्णको ठुलो मन्दिर समेत रहेकोछ)
- ▶ वडा नं. १० मा रहेको बाघ झोडा सिमसार (७ बिघा ५ कठ्ठा २ धुरमा फैलिएको)
- ▶ वडा नं. ६, ७ र ८ मा ९.७४ कि.मि. आधुनिक सुबिधा सम्पन्न ड्रेन तथा स्ट्रिट लाइट सहितको कालोपत्रे निर्माण भइरहेको ।
- ▶ वडा नं. ७ मा ४० मेट्रिक टनको चिस्यान केन्द्र निर्माण भएको ।

शैक्षिक संस्थाहरु

- ▶ वडा नं. ७ र ८ मा पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालयको केन्द्रिय कार्यालय रहकोछ,
- ▶ वडा नं. १२ मा सुकुना बहुमुखी क्याम्पस (M.Ed र MBS सम्मको पढाई हुने गरेको) रहकोछ,
- ▶ सामुदायिक विद्यालयको संख्या: ३६ (मदरसा-१ र गुरुकुल-१),
- ▶ संस्थागत विद्यालयको संख्या: ४४,
- ▶ वडा नं. १० मा रहेको सुकुना माध्यमिक विद्यालय विद्यार्थी भर्न संख्याको आधारमा नेपालकै उत्कृष्ट १० मा पर्ने गरेको (नमुना विद्यालयको रूपमा सञ्चालित, प्राविधिक शिक्षा समेत प्रदान गर्ने गरेको),
- ▶ वडा ५ मा रहेको साजिलाल माध्यमिक विद्यालय बिग स्कुलको अवधारणामा जाँदै गरेको जसमा प्राविधिक धारका साथै शिक्षासँगै कृषि उत्पादनमा विद्यार्थीहरु जोडिएका,
- ▶ वडा नं. ७ मा पञ्चायत माध्यमिक विद्यालयको आधुनिक विद्यालय भवन निर्माण भइरहेको ।

स्वास्थ्य सेवा तर्फ

- ▶ MDGP विशेषज्ञ सहितको १५ बेडको नगर अस्पताल सञ्चालनमा रहेको तथा नगर अस्पतालको सेवा केन्द्रको रूपमा स्वास्थ्य केन्द्र दुलारीबाट MBBS डाक्टर सहितको सेवा रहेको,
- ▶ वडा नं. ३ मा आरोग्य केन्द्र सञ्चालनमा रहेको,
- ▶ पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालयमा १०० बेड सम्मको अस्पताल (बर्षिक – ५० जना डाक्टर पढाउने कोटा रहेको) समेत सञ्चालनमा रहेको,
- ▶ प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य केन्द्रहरु सञ्चालनमा रहेको,
- ▶ वडा नं. १ मा १५ बेडको सुन्दरहरैँचा नगर अस्पताल निर्माण भई रहेको ।

स्थानीय तहको समग्र अवस्थाको विवरण

सि.नं	विवरण	अवस्था
१	जनशक्ति व्यवस्थापन	क. जम्मा स्वीकृत दरवन्दी: २३१ हाल कार्यरत:- २२८ ख. कर्मचारी समायोजन पश्चात O & M सर्वेक्षण प्रतिवेदन १४ औं नगरसभाबाट स्वीकृत भएको ।
२	प्रशासकीय भवन र पहुँच	क. प्रमुख प्रशासनिक भवन: साविक कोशीहरैँचा नगरपालिकाको कार्यालयबाट हाल सेवा प्रवाह भई रहेको तथा साबिक सुन्दरदुलारी नगरपालिकाको कार्यालयमा समेत केही शाखा रहेको र वडा नं. ८ मा सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन बनाउने तयारी हुँदै गरेको । ख. आफ्नै वडा कार्यालय: भएको वडा संख्या ९ (नभएको वडा संख्या ३ (वडा नं. ७, १० र १२) ग. वडा केन्द्रसम्म सडक पुगेको वडाको संख्या: सबै वडामा सडक पुगेको ।
३	कानून निर्माणको अवस्था (आ.व. २०८१ सालमा निर्माण गरिएका)	क. ऐनको संख्या: नयाँ - ५ (संशोधन - ४) जम्मा - ९ ख. नियमावलीको संख्या: नयाँ ४ ग. कार्यविधि संख्या: नयाँ - ४ घ. निर्देशिकाको संख्या: - ड. मापदण्ड: नयाँ - २
४	विभिन्न योजना तथा दस्तावेज निर्माणको अवस्था	क. आवधिक योजना: नवनेको तर आयोजना बैंक मार्फत आयोजनाहरु कार्यान्वयन हुने गरेको । ख. वार्षिक बजेटसँगै तोकिएको ढाँचा अनुरूप मध्यमकालिन खर्च संरचना: कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको । ग. स्थानीय तहको वस्तुस्थिति विवरण: बनेको । घ. भूउपयोग योजना: बनेको । ड. स्थानीय भवन निर्माण मापदण्ड: बनेको । च. राजस्व सुधार कार्ययोजना: बनेको । छ. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली: बनेको ।

स्थानीय तहको समग्र अवस्थाको विवरण

सि.नं	विवरण	अवस्था
५	स्थानीय तहको मूल्याङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणालीको प्रयोग	क. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको प्राप्ताङ्क ८४.५% (आ.ब. २०८०/०८१) मिति २०८२/०५/०६ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुणस्तर परिक्षण पश्चात प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार) ख. स्थानीय तहको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनको प्राप्ताङ्क ७६.५ % (गुणस्तर परीक्षण पश्चात) (आ.ब. २०८०/०८१) ग. मन्त्रालयले तयार गरेको स्थानीय तहको प्रगति अनुगमन प्रणालीमा विवरण प्रविष्टी: गर्ने गरेको ।
७	न्यायिक समिति सम्बन्धी	क. दर्ता भएका उजुरी/गुनासो/मुद्दाको संख्या (आ.व. २०८१/०८२):- १०९ वटा (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७(१) अनुसार – ३४ वटा र दफा ४७(२) - मेलमिलापबाट – ७५ वटा) ख. कारवाही वा फछ्यौट भएका उजुरी/गुनासो/मुद्दाको संख्या (आ.व. २०८१/०८२):- ७७ वटा (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७(१) अनुसार – २४ वटा र दफा ४७(२) - मेलमिलापबाट – ५३ वटा) ग. फछ्यौट हुन बाँकी उजुरी/गुनासो/मुद्दाको संख्या (आ.व. २०८१/०८२ मा):- ३२ वटा (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७(१) अनुसार – १० वटा र दफा ४७(२) - मेलमिलापबाट – २२ वटा)
८	बेरुजु सम्बन्धी	क. आ.व. २०७४/०७५ देखि आ.व. २०८१/०८२ सम्मको कायम कुल बेरुजु रकम रु. ५७ करोड १७ लाख ६८ हजार ५५२ ख. आ.व. २०८१/०८२ मा फछ्यौट भएको बेरुजु रकम रु. ३२ करोड ७८ लाख २४ हजार ९०६ ग. फछ्यौट गर्नुपर्ने कुल बेरुजु रकम रु. २४ करोड ३९ लाख ४३ हजार ६४६
९	वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन	क. दमकल सेवाको उपलब्धता: आफ्नै भएको ख. फोहोर प्रशोधन केन्द्र: नभएको ग. स्यानीटरी ल्याण्डफिल साईट: भएको

स्थानीय तहको समग्र अवस्थाको विवरण

सि.नं	विवरण	अवस्था
१०	सेवा प्रवाह, पारदर्शिता र जवाफदेहिता	क. अनलाईन मार्फत प्रदान गरिएको सेवाको संख्या: १२ (शुत्र-लेखा/राजश्व, PAMS, EMIS, HMIS, ई-हाजिरी, दर्ता-चलानी, ई-बोलपत्र, उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको सम्झौता, कृषिको तथ्याङ्कका लागि कृषि नियन्त्रण प्रणाली, न्यायिक समितिमा फिरादपत्र दर्ता, अपाङ्गता परिचय पत्र, EBPS - Online नक्सा पास लागायतका सेवा) ख. नागरिक वडापत्र: QR सहितको नागरिक वडापत्र रहको ग. सूचना अधिकारी: तोकेको (आ.व. २०८१/०८२ मा माग भएको सूचनाको संख्या – ७) घ. गुनासो व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुनुवाई, सार्वजनिक परीक्षण र सामाजिक परीक्षणको लागि कानूनी व्यवस्था: भएको ड. निगरानी निकाय तथा कार्यालयमा प्राप्त (दर्ता भएको) उजुरी/गुनासो संख्या: - फछ्यौट संख्या: -
११	अभियानमूलक कार्यक्रम	क. बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन तथा घोषणाका लागि सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको प्रतिवद्धता गर्ने अभियानको थालनी मिति २०८१/०३/०२ गते भएको त्यसै दिनको कार्यक्रमले मिति २०८३/०२/०९ गते भित्र बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्ने लक्ष राखेको । ख. पोषणमैत्री स्थानीय तह घोषणा भएको वडाको संख्या: नभएको । ग. बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा भएको वडाको संख्या: नभएको ।

आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) को खुद आम्दानी र खर्चको विवरण

स्रोतको किसिम			खुद प्राप्त भएको	खर्च	खर्च प्रतिशत
वित्तीय समानीकरण अनुदान	सङ्घ		रु. १९ करोड ४ लाख ९३ हजार ७६०	रु. १५ करोड ३५ लाख ४९ हजार ३२७	९६.३५ %
	प्रदेश		रु. १ करोड ३३ लाख ७० हजार	रु. १ करोड ३ लाख ७६ हजार ३५	७७.६० %
सशर्त अनुदान	सङ्घ	चालु	रु. ३३ करोड ४ लाख ३५ हजार १००	रु. ३१ करोड १३ लाख ८२ हजार ७२१	९४.२३ %
		पुँजीगत	रु. ३४ करोड ६३ लाख ३० हजार ७६०	रु. २१ करोड ४ लाख ९२ हजार ९५४	७०.७८ %
	प्रदेश	चालु	रु. ३८ लाख	रु. ३५ लाख ४६ हजार ४५७	९३.३३ %
		पुँजीगत	रु. १ करोड ९ लाख	रु. ८२ लाख १९ हजार ३९४	७५.४१ %
समपुरक अनुदान	सङ्घ		रु. १ करोड ४५ लाख	रु. १ करोड ४५ लाख	१०० %
	प्रदेश		रु. १ करोड ३० लाख	रु. १ करोड ११ लाख ७२ हजार ८४१	८५.९५ %
विशेष अनुदान	सङ्घ		रु. २ करोड ४६ लाख	रु. २ करोड ४५ लाख ११ हजार ६६२	९९.६४ %
	प्रदेश		-	-	-
राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त	सङ्घ		रु. १४ करोड ७७ लाख ८० हजार १८०	रु. ९ करोड २१ लाख ३२ हजार २१६	६२.३४ %
	प्रदेश		रु. १ करोड ८२ लाख ६५ हजार ६२५	रु. ६८ लाख ८३ हजार ५६७	३७.६९ %
रोयल्टी (बन रोयल्टी-सङ्घ)			रु. ६ लाख ८३ हजार १४०	रु. १ लाख ८० हजार	२६.३५ %
आन्तरिक स्रोत (स्थानीय तहको राजस्व अधिकार भित्रको मात्र)			रु. १४ करोड ६९ लाख ४३ हजार ७६१	रु. ११ करोड ८५ लाख १ हजार ९४२	८०.६४ %
अन्य (अ.ल्या. भए खुलाउने)			रु. १७ करोड ४० लाख ६० हजार ७५०	रु. १४ करोड ६९ लाख ४३ हजार ७६१	
ऋण (नगर विकास कोष मार्फत प्राप्त) - (आ.व. २०८१/०८२ असार मसान्त सम्मको) (मिति २०८२/०२/०७ गतेको पत्रानुसार)			रु. ६ करोड ९२ लाख ५० हजार ७१०/५४	-	-
जम्मा (ऋण बहेक)			१ अर्ब ३९ करोड ६७ लाख ४० हजार ७६९	१ अर्ब ७ करोड ३४ लाख ५० हजार २१६	७६.८५%

विषयक्षेत्रगत विनियोजन र खर्चको अवस्था (आ.व. २०८१/०८२)

क्र.सं.	विषय क्षेत्र	वार्षिक विनियोजित बजेट		खर्च रकम		खर्च प्रतिशत		कैफियत
		चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत	चालु	पुँजीगत	
१	आर्थिक विकास (बजेट विनियोजनको भार – १.२२%)	रु. १ करोड ९७ लाख ४ हजार	रु. २६ लाख	रु. १ करोड ३३ लाख ८२ हजार ९६०	रु. १९ लाख ४९ हजार २३४	६७.९२ %	७४.९७ %	
२	सामाजिक विकास (बजेट विनियोजनको भार – २६.३८ %)	रु. ४४ करोड ७९ लाख ६४ हजार	रु. ३ करोड ५३ लाख ६० हजार	रु. ३७ करोड ८९ लाख ४९ हजार ९९९	रु. २ करोड ८७ लाख ७ हजार ३९३	८४.७४ %	८९.९९ %	
३	पूर्वाधार विकास (बजेट विनियोजनको भार – ५५.६९ %)	रु. ४५ लाख ९२ हजार ६०५	रु. १ अर्ब १ करोड ३९ लाख ४० हजार ४४४	रु. ३४ लाख ६० हजार ३००	रु. ४९ करोड ९० लाख ५२ हजार ३२६	७५.३४ %	४९.२२ %	
४	वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन (बजेट विनियोजनको भार – १.२३ %)	रु. २ करोड २४ लाख ७५ हजार	-	रु. ३४ लाख ४० हजार ९०४	-	९५.३९ %	-	
५	सुशासन तथा संस्थागत क्षमता विकास (बजेट विनियोजनको भार – १.१७ %)	रु. २ करोड १३ लाख ९८ हजार ७००	-	रु. १ करोड ३२ लाख २५ हजार १९४	-	६९.८० %	-	
६	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च (बजेट विनियोजनको भार – १४.३९ %)	रु. २४ करोड २२ लाख ४ हजार ९९९	रु. १ करोड ३० लाख	रु. १९ करोड ६३ लाख ६ हजार ४४९	रु. १ करोड १५ लाख १५ हजार १०२	८९.०५ %	८८.५८ %	
७	वित्तीय व्यवस्थापन	रु. ६५ लाख		रु. ६५ लाख		१००%		
जम्मा (वित्तीय व्यवस्थापन बाहेक)		रु. ७५ करोड ७५ लाख ३९ हजार ३०४	रु. १ अर्ब ६ करोड ४९ लाख ४४४	रु. ६० करोड ८७ लाख ५७ हजार ७९०	रु. ५४ करोड ११ लाख ८६ हजार ९२९	८०.३६ %	५०.८२ %	

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मुख्य उपलब्धीहरू

सि. नं	सूचक	वेसलाईन (आ.व. २०८०/८१ सम्मको अवस्था)	आ.व. २०८१/०८२ को प्रगति	आ.व. २०८१/०८२ को सम्मको अवस्था
१	स्थानीय तह भित्र निर्मित स्थानीय सडक <u>(कालोपत्रे/पेवल्स/ढलान) (मिटरमा)</u>		६,९८२/५,३३२/२७०	
२	स्थानीय तह भित्र निर्मित स्थानीय सडक <u>कालोपत्रे मर्मत (मिटरमा)</u>		२,१७५	
३	स्थानीय तह भित्र निर्मित स्थानीय सडक <u>उच्च स्तरिय ग्राभेल (मिटरमा)</u>		२३,६८५	
४	स्थानीय तह भित्र निर्मित स्थानीय सडक <u>एजिडूग (मिटरमा)</u>		२३,८१३	
५	स्थानीय तह भित्र निर्मित स्थानीय सडक <u>ड्रेन निर्माण (मिटरमा)</u>		१,२७९	
६	खाने पाइप विस्तार / धारा जडान		६,०३५ मि./ १५ वटा	
७	कृषि बाध/पैनी/कुलो निर्माण <u>(मिटरमा)</u>		४६	
८	कल्भर्ट निर्माण		१७ वटा	
९	विद्यालय भवन निर्माण		१ वटा	
१०	कृषि बजार टहरा निर्माण		२ वटा	
११	कंकट फलैचा (कंकटको बस्ने बेन्च)		५५ वटा	
१२	नदि नियन्त्रण/तटबन्धन <u>(मिटरमा)</u>		९९५	
१३	जग्गा संरक्षण/घेरावेरा गर्ने कार्य <u>(मिटरमा)</u>		७१३	
१४	सामुदायिक भवन निर्माण / शौचालय निर्माण		१३ वटा / ३ वटा	
१५	मन्दिर/साकेल थान/गुम्बा लगायत धार्मिक स्थल निर्माण		४ वटा/२,८२६ मि.	
१६	मर्मत तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य (भवन/गेट/सार्वजनिक स्थल)		२८ वटा	
१७	ह्युमपाइप		४ वटा	
१८	बोरिङ		४ वटा	
१९	सडक बत्ती		६०१ वटा	
२०	सडक ऐना जडान		९ वटा	

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मुख्य उपलब्धीहरू

सि. नं	सूचक	वेसलाईन (आ.व. २०८०/८१ सम्मको अवस्था)	आ.व. २०८१/०८२ को प्रगति	आ.व. २०८१/८२ को सम्मको अवस्था
१	सिंचाई सुविधा पुगेको जमिनको क्षेत्रफल (हेक्टर)	४७३०	८०	४,८१०
२	स्थानीय तहमा दर्ता/सूचीकृत भएका उद्योग/फार्मको संख्या	८,२८६	नयाँ व्यवसाय दर्ता - २५२	व्यवसाय दर्ता - ८,५३८
३	सामुदायिक विद्यालयको (माथिल्लो तहमा भर्ना हुन योग्य हुनेगरी) SEE उत्तिर्ण दर	५९.२%		
४	आधारभूत तहको खानेपानी पुगेको घरधुरी प्रतिशत	१००%	१००%	१००%
५	आधारभूत तहको सरसफाई पुगेको घरधुरी प्रतिशत	९८%	९९%	९९%
६	रोजगार सूचना केन्द्रमा सूचीकृत वेरोजगारको संख्या	११७	१५४	१५४

बजेटको आधारमा:

स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रमको विवरण

क्र.सं.	बिबरण	आ.व. २०८१/८२ को आयोजना संख्या
१.	५० लाख भन्दा बढी बजेटको आयोजना	१२
२.	२०+ देखि ५० लाखसम्मको आयोजना (२+१२+१)	१५
३.	५+ देखि २० लाखसम्मको आयोजना (६०+३३+७)	१००
४.	५ लाखसम्म बजेटको आयोजना (१३३+१५+६)	१५४
	जम्मा	२८१

कार्यान्वयन तह/क्षेत्रको आधारमा:

क्र.सं.	बिबरण	आ.व. २०८१/८२ को आयोजना संख्या
१.	नगरपालिका स्तरीय (५६+५७)	११३
२.	वडास्तरीय (१५३+१५)	१६८
	जम्मा	२८१

आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि:

क्र.सं.	बिबरण	आ.व. २०८१/८२ को आयोजना संख्या
१.	उपभोक्ता समिति मार्फत (सम्झौता भएको – २२५)	१९५
२.	निर्माण व्यवसायी मार्फत (५७+१५)	७२
३.	अन्य (बिद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्माण समिति मार्फत)	१४
	जम्मा	२८१

बहुवर्षिय आयोजना तथा कार्यक्रम र समस्याग्रस्त आयोजनाको विवरण

आ.व. २०८१/०८२ बाट दायित्व सरे बहुवर्षे आयोजना तथा कार्यक्रमको विवरणः

क्र.सं.	आयोजना तथा कार्यक्रमको विवरण	कार्यान्वयन अवधि (आ.व. २०..../... देखि २०८.../...)	कुल लागत	लागत साझेदारी			हाल कार्यान्वयनको अवस्था
				संघ	प्रदेश	स्थानीय	
१	Construction of Building and Other Infrastructure fo Budhabare Agricultural Market, Sudarharaicha-9 (SHM/MOR/NCB/TDF/W/33/2078/079)	2078/079 to 2082/083	11,82,02,611	संघ	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।
२	RCC Box Culvert Construction Works of Ita bhatta BK ko Ghar Chheuma,sundarharaicha 01 (SHM/MOR/NCB/W-39/2080/081)	2080/082 to 2082/083	28,66,247.28	-	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।
३	Box Culvert Construction Works of Sajilal School Paschim, Sundarharaicha-06 (SHM/MOR/SQ/W/25/2081/082)	2081/082 to 2082/083	14,39,977.59	-	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।
४	Construction of RCC Slab Culvert, Karaiwana-Jambandh-Haraicha Road (Jestha Nagarik bhawan Aagadi), Sundarharaicha 01 (SHM/MOR/SQ/W/27/2081/082)	2081/082 to 2082/083	11,61,900.14	-	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।
५	Construction of Ward Office Premises Sundarharaicha-02 (SHM/MOR/NCB/W/42/2081/082)	2081/082 to 2082/083	15,80,647.37	-	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।
६	Construction of School Building of Shree Panchayat Ma. Vi. School, Sundarharaicha 07, Morang (SHM/MOR/NCB/W/09/2081/082)	2081/082 to 2082/083	3,28,89,717.82	भारत सरकार	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।
७	Construction Work of JCI Gachhiya Samudayik Bhawan and Training Centre, Sundarharaicha-03 (SHM/MOR/TMPP/NCB/W/19/2081/082)	2081/082 to 2082/083	51,05,234.48	संघ	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।
८	Supply and installation of Network Equipment and Service (SHM/MOR/SQ/W/23-2081/082)	2081/082 to 2084/085	5,79,919.31	-	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।
९	Construction of Truss Building in Second floor of Shree shikshya Niketan Ma. Vi., Sundarharaicha-08 (SHM/MOR/NCB/W/28/2081/082)	2081/082 to 2082/083	31,74,367.98	-	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।

बहुवर्षिय आयोजना तथा कार्यक्रम र समस्याग्रस्त आयोजनाको विवरण

क्रमश..... आ.व. २०८१/०८२ बाट दायित्व सरे बहुवर्षे आयोजना तथा कार्यक्रमको विवरण:

क्र.सं.	आयोजना तथा कार्यक्रमको विवरण	कार्यान्वयन अवधि (आ.व. २०..../... देखि २०८.../...)	कुल लागत (रु.मा)	लागत साझेदारी			हाल कार्यान्वयनको अवस्था
				संघ	प्रदेश	स्थानीय	
१०	Construction of Blacktopped Road of Madhyali Marga, Sundarharaicha-07 (SHM/MOR/NCB/W/29/2081/082)	2081/082 to 2082/083	66,36,049.70	-	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।
११	Selection of Firm for Solid Waste Management Service of Sundarharaicha Municipality for PPP Model (SHM/MOR/NCS/45/2081/082)	2081/082	-	-	-	स्थानीय	आशय जारी भएको
१२	Construction of Primary Health Post Building, Sundarharaicha-04 (SHM/MOR/NCB/W/50/2081/082)	2081/082 to 2082/083	51,67,650.62	जि. स.स .	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।
१३	Street Lightining Work with phase Addition and Pole Erection (SHM/MOR/NCB/W/55/2081/083)	2081/082 to 2082/083	44,00,820.50	-	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।
१४	Construction Works of School Building of Shree Ram Aadharbhut Bidhyalaya, Sundarharaicha-09 (SHM/MOR/NCB/W/76/2081/082)	2081/082 to 2082/083	38,72,779.70	-	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।
१५	Sukrabare Khelmaidan Stage Nirman, Sundarharaicha-12 (SHM/MOR/NCB/W/75/2081/082)	2081/082 to 2082/083	31,00,000	-	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।
१६	Public Toilet Construction Work (SHM/MOR/SQ/W/82/2081/082)	2081/082 to 2082/083	38,72,779.70	-	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।
१७	Construction of Administrative Building of Nagar Hospital, Sundarharaicha-1 (SHM/MOR/NCB/W/17/2081/082)	2081/082 to 2083/084	6,51,53,880.04	संघ	-	-	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।

बहुवर्षिय आयोजना तथा कार्यक्रम र समस्याग्रस्त आयोजनाको विवरण

समस्याग्रस्त आयोजना/कार्यक्रमको विवरण:

क्र.सं.	आयोजना तथा कार्यक्रमको विवरण	कार्यान्वयन शुरू भएको बर्ष	हाकको अवस्था	जम्मा लागत (रु.मा)	स्रोत
१	Construction of Hasina Simsar Park Works, Sundarharaicha-05 (SHM/MOR/NCB/W/51/2077/78)	2077/078	केन्द्रले बजेट नपठाएको भएर हाललाई म्यादथप नभएको	5,39,74,081.9	संघ र स्थानीय
२	Black Top Road Construction Work Of Laxmipur - Haraincha-Sagarmatha Chowk Road and Kumar Gaun Road Sundarharaincha 01 (SHM/MOR/NCB/W/22/2078/079)	2078/079	पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्तिको समयमा पनि कार्यसम्पन्न नभएकोले कार्यसम्पादन जमानत जफत गरिएको	1,47,48,597.1	स्थानीय
३	Black Top Road Construction Work Of Salakpur - Paccham Road Sundarharaincha 10 , 11 (SHM/MOR/TMPP/NCB/W/23/2078/079)	2078/079	पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्तिको समयमा पनि कार्यसम्पन्न नभएकोले कार्यसम्पादन जमानत जफत गरिएको	1,37,76,030.1	स्थानीय
४	Blacktop Road Construction Works Of Dhati Bhutahi tole Hulaki Marga Road Sundarharaicha -02,11 (SHM/MOR/NCB/W/31/2078/079)	2078/079	पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्तिको समयमा पनि कार्यसम्पन्न नभएकोले कार्यसम्पादन जमानत जफत गरिएको	1,49,28,312.8	स्थानीय
५	Construction of Blacktop Roads, Sundarharaicha 02, 07, 9 and 10 (SHM/MOR/NCB/W-7/2079/080)	2079/080	१ पटक म्यादथप हटाँ नि कार्यसम्पन्न नभएको र निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा नआएकोले कार्यसम्पादन जमानत जफत गरिएको	67,51,976.8	स्थानीय
६	Construction of Blacktop Roads and Laying Pebbles (Block) in different roads, Sundarharaicha 9, 10 and 12 (SHM/MOR/NCB/W-12/2079/080)	2079/080	२ पटक म्यादथप हटाँ नि कार्यसम्पन्न नभएको र निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा नआएको	1,07,78,348.14	स्थानीय
७	Interlocking Block Road Construction Works of Bangali Tole to Ram Aa.Bi.Road Sundarharaicha 09 & Jestha Nagarik Marga Sundarharaicha 10 (SHM/MOR/NCB/W-43/2080/081)	2080/081		37,50,846.87	स्थानीय

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादित उल्लेखनिय मुख्य मुख्य कार्यहरु

- बेरुजु फर्यौटलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरी आ.व. २०८१/०८२ मा रु. ३२ करोड ७८ लाख २४ हजार ९०६ बेरुजुलाई फर्यौट गरिएको (जम्मा बेरुजुको ५७.३३% - एकै आर्थिक बर्षमा फछौट गरिएको),
- फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने कार्य (PPP Model मा लैजाने) अन्तिम तयारी रहेको,
- विपन्न नागरिकलाई धारा जडान – ११० घरमा
- विपन्न नागरिकलाई २ कोठे घर निर्माण – १५० वटा
- व्यसवाय दर्ता (१५० वटा गरिएको) तथा नविकरण (४०५ वटा गरिएको) गर्ने कार्य घुम्टि सेवालाई निरन्तरता दिइएको । आ.व. २०८१/०८२ मा थप रु. २७ लाख भन्दा बढी आन्तरिक आय बृद्धि भएको,
- आ.व. २०८१/०८२ को सुरुवात देखि नै त्रैमासिक रूपमा क्षेत्रगत समितिको समिक्षा हुने गरेको तथा सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ दफा ५(३) अनुसार स्वतः प्रकाशनको हुने गरेको,
- उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन हुने रु. १० लाख सम्मका आयोजनको सम्झौता तथा भुक्तानी सिफारिस सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट नै हुने गरेको,
- श्रोत सुनिश्चित भए पश्चात मात्र आयोजा तथा कार्यक्रमको सम्झौता गर्ने कार्यको सफल अभ्यासको सुरुवात गरिए सँगै वित्तीय अनुसाशानलाई विशेष ध्यान दिइएको,
- कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको (नगर प्रमुख र प्र.प्र.अ.का बिच तथा प्र.प्र.अ. र शाखा प्रमुखका बिच),
- १४ औं नगरसभाबाट O&M स्वीकृत भएसँगै दरबन्दि अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको तथा TOR का आधारमा कार्य जिम्मेवारी तोकिएको,
- घर नक्साको कार्य गर्दा अधिकांश कार्य वडा कार्यालयबाट नै हुने गरीको संयन्त्रको बिकास गरी कार्यान्वयनमा रहको तथा यस आर्थिक बर्षबाट Online प्रणालीबाट घरनक्सा पास तथा अभिलेखिकरण हुने गरेको,
- प्रविधि मैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यको थालनी गरीएको ।

बेरूजु र बेरूजु फछौटको अवस्था

मिति २०८१ श्रावण १ गते देखि २०८२ असार ३२ गते सम्मको विवरण

क्र.सं	विवरण	आ.व. २०७४/७५ देखिको हाल सम्मको अध्यावधिक बेरूजुको अवस्था (४+५)	आ. २०८१/०८२ मा फछौट भएको बेरूजु (रू. मा)	फछौट हुन बाँकी रहेको बेरूजु रकम (रू.मा)	फछौटको प्रक्रियामा रहेको बेरूजु रकम (रू.मा)	आ.व. २०८०/०८१ मा कयम भएको बेरूजु रकम (रू.मा)
१	२	३	४	५	६	७
१	बेरूजु रकम	रू. ५७ करोड १७ लाख ६८ हजार ५५२	रू. ३२ करोड ७८ लाख २४ हजार ९०६	रू. २४ करोड ३९ लाख ४३ हजार ६४६	रू. १ करोड ७ लाख ४ हजार १३८	रू. ३ करोड ७१ लाख २७ हजार १४९

उल्लेखनिय कार्यहरु मध्ये अनुकरणीय कुनै एक अभ्यासको विस्तृतीकरण

विषयको शीर्षक (असल अभ्यासको नाम): बेरूजु फर्यौटलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरी एकै आर्थिक वर्षमा (आ.व. २०८१/०८२ मा) रू. ३२ करोड ७८ लाख २४ हजार ९०६ बेरूजुलाई फर्यौट गरिएको (जम्मा बेरूजुको ५७.३३% - एकै आर्थिक वर्षमा फछौट गरिएको)

पूर्व अभ्यास तथा अनुभव:

- ▶ बेरूजुलाई सामान्य रूपमा लिने गरेको ।

परिवर्तन गरिएको मुख्य पक्षहरु:

- ▶ बेरूजु फर्यौटका लागि Outsourcing मार्फत दक्ष व्यक्तित्वबाट सेवा करार मार्फत भएको,
- ▶ गत विगतको बेरूजु फर्यौटसँगै आउँदा दिनहरूमा बेरूजु नहुने गरी भुक्तानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइएको,

उल्लेखनिय कार्यहरु मध्ये अनुकरणीय कुनै एक अभ्यासको विस्तृतीकरण

क्रमश.....

मुख्य सिकाई:

- ▶ सार्वजनिक निकायले खर्च गर्दा आय र व्ययको ध्यानमा राख्दै वित्तीय अनुसाशनको पलना गर्दै विकास निर्माण, सेवा प्रवाह गर्नु पर्ने विषय मुख्य सिकाई रहयो ।

भावी योजना:

- ▶ सकेसम्म बेरुजु नहुने गरी कार्यहरु गर्ने,
- ▶ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु असुल गर्दै अन्य बेरुजु हकमा कागजात पेश गर्नु पर्नेमा कागजात पेश गरेर तथा प्रक्रिया छुट भएको कारणबाट हुने बेरुजुलाई प्रक्रिया पुर्‍याई बेरुजु फर्‍योट गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने,
- ▶ सबै पक्षलाई कानुनले पुरा गर्नु पर्ने प्रक्रिया र पेश गर्नु पर्ने कागजातका सम्बन्धमा जानकारी मुलक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने,
- ▶ स्थानीय सरकारले बनाउन पर्ने कानुन नबनाएको कारणबाट भएको बेरुजुलाई आउदा दिनमा कानुन बनाएर कानुनले निर्धारण गरेको विधि पद्धति बमोजिम काम गर्ने/गराउने,

स्थानीय तहले अनुभूत गरेका प्रमुख समस्या

- संघीय सरकार/प्रदेश सरकारबाट दिएको सिलिङ्ग अनुसार बजेट निकास नहुने गरेको,
- संघीय सरकार/प्रदेश सरकारबाट नै कार्यान्वय हुने गरी छनौट भएका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा समन्वय नहुने गरेको,
- स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्दाको समयमा दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी समायोजन गरी पठाईएको तर हाल उक्त दरबन्दी भन्दा बढी रहेका कर्मचारीहरूको तलबका लागि बजेट निकास समस्या हुने गरेको,
- भौतिक पूर्वाधारको काममा निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नसक्ने प्रवृत्ति (कानुनी प्रक्रियामा लैजान खोज्दा लामो समय लाग्ने),
- फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल्ड/डम्पिङ्ग साईट/प्रसोधन केन्द्र व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको,
- नदिजन्य पदार्थको उत्खन्न तथा बिक्री (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम प्रदेश सरकारको हिस्सा ४० % रहने भएता पनि राजस्व संकलन गर्ने प्रणाली विकास गर्न प्रदेश सरकार मौन रहने गरेको ।

जिल्ला समन्वय समिति मोरङसँग अपेक्षा

- ▶ जिल्लामा रहेका पालिकाहरूको महिनामा एक पटक बैठक राखी जल्दावाल्दा समस्याहरूको छलफल गरी त्यसको उचित निराकरण गर्न समन्वय बैठकको आयोजना गर्ने,
- ▶ जिल्लामा रहेका पालिकाहरूका समस्या, अवश्यकता तथा असल अभ्यासको आवाज माथिल्लो तहमा पुऱ्याउने,
- ▶ विपद् व्यवस्थापन (भूकम्प, बाढी, महामारी आदि) मा एकिकृत प्रणालीको विकास गरी सोहि अनुसार एकद्वार प्रणालीलाई सक्रिय बनाउने माथिल्लो तहमा पुऱ्याने,
- ▶ नदिज्य पदार्थको उत्खन्न, बिक्री वितरण लगायतका विषयमा नियमित अनुगमन गर्ने,
- ▶ संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने/गराउने,
- ▶ जिल्ला भित्रका एक भन्दा बढी पालिका जोड्ने बाटो, पुल निर्माण जस्ता भौतिक निर्माण गर्ने कार्यमा समन्वय गर्ने,
- ▶ जिल्ला भित्रका पालिकाहरूको तथ्याङ्क संकलन, विश्लेषण तथा व्यवस्थापन गर्ने ।

कोशी प्रदेश सरकारसँग अपेक्षा

- ▶ पालिका रहेका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्ने, (तालिम तथा प्रशिक्षणको माध्यमबाट),
- ▶ स्थानीय आवश्यकताका आधारमा आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरी समयमै बजेट निकासी गर्ने प्रणाली,
- ▶ संविधान र संघीय कानून प्रतिकूल हुने कानून निर्माण/प्रदेशले गर्ने निर्णय स्थिर हुने, (बन पैदावार बिक्रिको आम्दानीका आधारमा १०% स्थानीय सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व (बिक्रि Vs. नाफा), ई रिक्सा व्यवस्थापन),
- ▶ नदिजन्य पदार्थको बिक्रिबाट प्राप्त गर्ने हिस्सामा प्रदेशको हिस्सा-४०% स्वतः प्राप्त हुने तर त्यसको बिक्रिका लागि गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था, संरचनागत व्यवस्था तथा समन्वयात्मक विषयमा समेत पन्यास सहयोग तथा सहकार्य,
- ▶ दिगो तथा सन्तुलित विकासका लागि समुचित स्रोतसाधनको परिचालन गर्ने/गराउने प्रणालीको विकास,
- ▶ संघीय सरकार र पालिका सरकारका बिचको संवैधानिक भूमिकालाई थप प्रभावकारी हुने गरी काम गर्न पर्ने,
- ▶ पालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई थप चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

सङ्घीय सरकारसँग अपेक्षा

- ▶ समानिकरण अनुदान वपत प्राप्त हुने अनुदानको १००% रकम प्राप्त हुने सुनिश्चितता हुन पर्ने,
- ▶ स्थानीय आवश्यकताका आधारमा आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरी समयमै बजेट निकासा गर्ने प्रणाली,
- ▶ पालिका रहेका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्ने, (तालिम तथा प्रशिक्षणको माध्यमबाट),
- ▶ सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने/गराउने विषयमा नेतृत्व दायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने,
- ▶ संविधानको अनुसूची-९ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा रहेका विषयहरूको यथासिद्ध कानून निर्माण भए स्थानीय सरकारले थप प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्य गर्ने,
- ▶ आयोजना तथा कार्यक्रमका बारे संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट के-कति रकम बराबरको विनियोजन हुन पर्ने सो को स्पष्ट मापदण्ड हुन पर्ने,
- ▶ फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने कार्य स्थानीय सरकारको एकल प्रयासबाट मात्र व्यवस्थापन गर्न गाह्रो पर्ने हुँदा संघीय सरकारले समेत सो कार्यमा सहजिकरण गरिदिन पर्ने,
- ▶ कानूनत नापी र मालपोत कार्यालय स्थानीय सरकार अन्तर्गत रहेको तर व्यवहारत हालसम्म पनि संघीय सरकार अन्तर्गत नै रहेको हुँदा यथासिद्ध तत् निकायलाई स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिदिन पर्ने,
- ▶ राजश्व बाँडफाँडको हिस्सामा पालिकाले प्राप्त गर्ने हिस्सा बढाउन पर्ने,
- ▶ सशर्त अनुदान मार्फत संघीय सरकारबाट प्राप्त अधिकांश आयोजना तथा कार्यक्रमको स्थानीय आवश्यकता भन्दा फरक हुने गरेको हुँदा सशर्त अनुदानको सट्टा समानिकरण अनुदानलाई बढाएर पठाउने ।

धन्यवाद ।
