

सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको आ.व. २०८२/०८३ को बजेट कार्यान्वयनको बार्षिक समिक्षात्मक कार्यक्रमको प्रस्तुती

(मिति: २०८३ श्रावण २२ गते)

(स्थान: सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको कार्यालयमा)

गणेश राज कार्की

(प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत)

विवरण प्रस्तुतकर्ता

संजीव पौड्याल

(योजना तथा अनुगमन - अधिकृत)


सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको नक्सा



"सुन्दरहरैँचा, विकासको बगैँचा"



सुन्दरहरैँचा नगरपालिका को भौगोलिक नक्सा

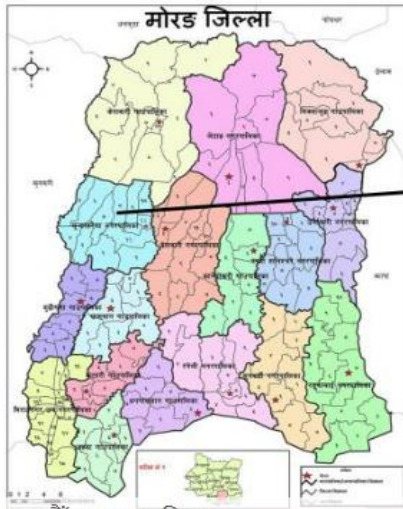

सुन्दरहरैँचा नगरपालिका



परिचय

- ▶ मिति २०७३ साल फाल्गुण २७ गतेको नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको गठन भएको हो ।
- ▶ साविक कोशीहरैँचा नगरपालिका (साविकका गाँउ विकास समितिहरु:- इन्द्रपुर, हरैँचा र मृगौलिया) र साविक सुन्दरदुलारी नगरपालिका (साविकका गाँउ विकास समितिहरु:- दुलारी र सुन्दरपुर) समायोजन भई सुन्दरहरैँचा नगरपालिका निर्माण भएको हो ।

भौगोलिक अवस्थिति:-

- ▶ यस नगरपालिकामा १२ वटा वडाहरु रहेका छन्,
- ▶ उत्तरी अक्षांश:- २६.६६ डिग्री
- ▶ पूर्विय देशान्तर:- ८७.३८ डिग्रीमा अवस्थित रहेको,
- ▶ क्षेत्रफल ११०.१६ बर्ग कि.मी. मा फैलिएको,
- ▶ कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरबाट १९ कि.मी. उत्तर तर्फ रहेकोछ,
- ▶ उचाई:- समुन्द्र सतह देखि ८३ मिटर देखि १४० मिटर सम्म रहेको,

सिमाना:

- ▶ पूर्व:- बेलबारी नगरपालिका
- ▶ उत्तर:- केराबारी गाउँपालिका
- ▶ पश्चिम:- इटहरी उप-महानगरपालिका
- ▶ दक्षिण:- ग्रामथान गाउँपालिका र बुढी गंगा गाउँपालिका

जनसंख्या (वि.सं. २०७८ अनुसार)

- कुल जनसंख्या: १,२०,२१३
- महिलाको संख्या: ६३,२३२
- पुरुषको संख्या: ५६,९८१
- घरधुरी संख्या: २९,८२६

महत्वपूर्ण पर्यटकिय स्थलहरू तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणः

- ▶ वडा नं. १ मा रहेको किचकगढी
- ▶ वडा नं. ३ मा रहेको शेषनारायण धाम
- ▶ वडा नं. ५ मा रहेको हसिना सिमसार (४९ हेक्टरमा फैलिएको)
- ▶ वडा नं. ५ मा रहेको नयाँ बृन्दावन गौशला (सुरुमा ४ कठ्ठाबाट निर्माण शुरू गरिएको यो धार्मिक स्थल अहिले ७ बिघा भन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको, प्रमुख आकर्षणः- विश्वकै अग्लो/ठुलो गाईको प्रतिमा रहेको तथा राधाकृष्णको ठुलो मन्दिर समेत रहेकोछ)
- ▶ वडा नं. १० मा रहेको बाघ झोडा सिमसार (७ बिघा ५ कठ्ठा २ धुरमा फैलिएको)
- ▶ वडा नं. ६, ७ र ८ मा ९.७४ कि.मि. आधुनिक सुबिधा सम्पन्न ड्रेन तथा स्ट्रिट लाइट सहितको कालोपत्रे निर्माण भइरहेको ।
- ▶ वडा नं. ७ मा ४० मेट्रिक टनको चिस्यान केन्द्र निर्माण भएको ।

शैक्षिक संस्थाहरु

- ▶ वडा नं. ७ र ८ मा पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालयको केन्द्रिय कार्यालय रहकोछ,
- ▶ वडा नं. १२ मा सुकुना बहुमुखी क्याम्पस (M.Ed र MBS सम्मको पढाई हुने गरेको) रहकोछ,
- ▶ सामुदायिक विद्यालयको संख्या: ३६ (मदरसा-१ र गुरुकुल-१),
- ▶ संस्थागत विद्यालयको संख्या: ४४,
- ▶ वडा नं. १० मा रहेको सुकुना माध्यमिक विद्यालय विद्यार्थी भर्न संख्याको आधारमा नेपालकै उत्कृष्ट १० मा पर्ने गरेको (नमुना विद्यालयको रूपमा सञ्चालित, प्राविधिक शिक्षा समेत प्रदान गर्ने गरेको),
- ▶ वडा ५ मा रहेको साजिलाल माध्यमिक विद्यालय बिग स्कुलको अवधारणामा जाँदै गरेको जसमा प्राविधिक धारका साथै शिक्षासँगै कृषि उत्पादनमा विद्यार्थीहरु जोडिएका,
- ▶ वडा नं. ७ मा पञ्चायत माध्यमिक विद्यालयको आधुनिक विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरणको चरणमा रहेको ।

स्वास्थ्य सेवा तर्फ

- ▶ MDGP विशेषज्ञ सहितको १५ बेडको नगर अस्पताल सञ्चालनमा रहेको तथा नगर अस्पतालको सेवा केन्द्रको रूपमा स्वास्थ्य केन्द्र दुलारीबाट MBBS डाक्टर सहितको सेवा रहेको,
- ▶ वडा नं. ३ मा आरोग्य केन्द्र सञ्चालनमा रहेको,
- ▶ पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालयमा १०० बेड सम्मको अस्पताल (बर्षिक – ५० जना डाक्टर पढाउने कोटा रहेको) समेत सञ्चालनमा रहेको,
- ▶ प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य केन्द्रहरु सञ्चालनमा रहेको,
- ▶ वडा नं. १ मा १५ बेडको सुन्दरहरैँचा नगर अस्पताल निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेको ।

स्थानीय तहको समग्र अवस्थाको विवरण

सि.नं	विवरण	अवस्था
१	जनशक्ति व्यवस्थापन	क. जम्मा स्वीकृत दरवन्दी (स्थायी र अस्थायी: २७७ हाल कार्यरत:- २५० ख. कर्मचारी समायोजन पश्चात O & M सर्वेक्षण प्रतिवेदन १४ औं नगरसभाबाट स्वीकृत भएको ।
२	प्रशासकीय भवन र पहुँच	क. प्रमुख प्रशासनिक भवन: साविक कोशीहरैँचा नगरपालिकाको कार्यालयबाट हाल सेवा प्रवाह भई रहेको तथा साबिक सुन्दरदुलारी नगरपालिकाको कार्यालयमा समेत केही शाखा रहेको र वडा नं. ८ मा सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि सम्झौताको अन्तिम चरणमा रहेको । ख. आफ्नै वडा कार्यालय: भएको वडा संख्या ९ (नभएको वडा संख्या ३ (वडा नं. ७, १० र १२) ग. वडा केन्द्रसम्म सडक पुगेको वडाको संख्या: सबै वडामा सडक पुगेको ।
३	कानून निर्माणको अवस्था (आ.व. २०८२ सालमा निर्माण गरिएका)	क. ऐनको संख्या: नयाँ – ५ (ऐन – संशोधन – ४) ख. नियमावलीको संख्या: नयाँ १ ग. कार्यविधि संख्या: नयाँ – ३ (कार्यविधि – संशोधन – १) घ. मापदण्डको संख्या: १ ङ. नीतिको नयाँ – १ च. निर्देशिका/आचारसंहिताको संख्या: नयाँ १
४	विभिन्न योजना तथा दस्तावेज निर्माणको अवस्था	क. आवधिक योजना: नवनेको तर आयोजना बैंक मार्फत आयोजनाहरु कार्यान्वयन हुने गरेको । ख. वार्षिक बजेटसँगै तोकिएको ढाँचा अनुरूप मध्यमकालिन खर्च संरचना: कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको । ग. स्थानीय तहको वस्तुस्थिति विवरण: बनेको । घ. भूउपयोग योजना: बनेको । ङ. स्थानीय भवन निर्माण मापदण्ड: बनेको । च. राजस्व सुधार कार्ययोजना: बनेको । छ. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली: बनेको ।

स्थानीय तहको समग्र अवस्थाको विवरण

सि.नं	विवरण	अवस्था
५	स्थानीय तहको मूल्याङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणालीको प्रयोग	क. Local Governance Performance Assessment System (LGPAS) मा (आ.ब. २०८१/०८२ को कार्यसम्पादन ६३.२% जिल्ला समन्वय समिति, मोरङ मार्फत भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गुणस्तर परिक्षणका लागि पेश गरिएको, ख. मन्त्रालयले तयार गरेको स्थानीय तहको प्रगति अनुगमन प्रणालीमा विवरण प्रविष्टी: गर्ने गरेको ।
७	न्यायिक समिति सम्बन्धी	क. दर्ता भएका उजुरी/गुनासो/मुद्दाको संख्या (आ.व. २०८२/०८३):- १०६ वटा (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७(१) अनुसार – ३२ वटा र दफा ४७(२) - मेलमिलापबाट – ७४ वटा) ख. कारवाही वा फछ्यौट भएका उजुरी/गुनासो/मुद्दाको संख्या (आ.व. २०८२/०८३):- ८३ वटा (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७(१) अनुसार – २७ वटा र दफा ४७(२) - मेलमिलापबाट – ५६ वटा) ग. फछ्यौट हुन बाँकी उजुरी/गुनासो/मुद्दाको संख्या (आ.व. २०८२/०८३ मा):- २३ वटा (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७(१) अनुसार – ५ वटा र दफा ४७(२) - मेलमिलापबाट – १८ वटा)
८	बेरुजु सम्बन्धी	क. आ.व. २०७४/०७५ देखि आ.व. २०८१/०८२ सम्मको कायम कुल बेरुजु रकम रु. ५७ करोड १७ लाख ६८ हजार ५५२ ख. आ.व. २०८१/०८२ मा फछ्यौट भएको बेरुजु रकम रु. ३२ करोड ७८ लाख २४ हजार ९०६ ग. फछ्यौट गर्नुपर्ने कुल बेरुजु रकम रु. २४ करोड ३९ लाख ४३ हजार ६४६ घ. आ.व. २०८१/०८२ को प्रतिवेदन प्राप्त नभएको, ड. आ.व. २०८२/०८३ मा बेरुजु असुल – रु. ३ लाख ७३ हजार ८८९/१०
९	वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन	क. दमकल सेवाको उपलब्धता: आफ्नै भएको ख. फोहोर प्रशोधन केन्द्र: नभएको ग. स्थानीय टरी ल्याण्डफिल साईट: भएको

स्थानीय तहको समग्र अवस्थाको विवरण

सि.नं	विवरण	अवस्था
१०	सेवा प्रवाह, पारदर्शिता र जवाफदेहिता	क. अनलाईन मार्फत प्रदान गरिएको सेवाको संख्या: १२ (शुत्र-लेखा/राजश्व, PAMS, EMIS, HMIS, ई-हाजिरी, दर्ता-चलानी, ई-बोलपत्र, उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको सम्झौता, कृषिको तथ्याङ्कका लागि कृषि नियन्त्रण प्रणाली, न्यायिक समितिमा फिरादपत्र दर्ता, अपाङ्गता परिचय पत्र, EBPS - Online नक्सा पास लागायतका सेवा) ख. नागरिक वडापत्र: QR सहितको नागरिक वडापत्र रहको ग. सूचना अधिकारी: तोकेको (आ.व. २०८२/०८३ मा माग भएको सूचनाको संख्या – ४) घ. गुनासो व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुनुवाई, सार्वजनिक परीक्षण र सामाजिक परीक्षणको लागि कानूनी व्यवस्था: भएको ड. निगरानी निकाय तथा कार्यालयमा प्राप्त (दर्ता भएको) उजुरी/गुनासो संख्या: ३ फछ्यौट संख्या: ३
११	अभियानमूलक कार्यक्रम	क. वालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन तथा घोषणाका लागि सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको प्रतिवद्धता गर्ने अभियानको थालनी मिति २०८१/०३/०२ गते भएमा सोही अनुसारका कार्यक्रमहरू हुँदै आएको, ख. पोषणमैत्री स्थानीय तह घोषणा भएको वडाको संख्या: नभएको । ग. वालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा भएको वडाको संख्या: नभएको ।

आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को आय प्राप्त गर्ने लक्ष्य र खुद आम्दानीको विवरण

स्रोतको किसिम			आय प्राप्त गर्ने लक्ष्य (रू. मा)	खुद प्राप्त भएको	प्रगति (%)
वित्तीय समानीकरण अनुदान	सङ्घ		रू. २० करोड ४५ लाख	रू. १८ करोड ७० लाख १५ हजार २५०	९१.४५ %
	प्रदेश		रू. १ करोड ९३ लाख १४ हजार	रू. १ करोड ९३ लाख १४ हजार	१०० %
सशर्त अनुदान	सङ्घ	चालु	रू. ३८ करोड ५७ लाख ५६ हजार	रू. ३७ करोड ९५ लाख ३१ हजार	९८.३८ %
		पुँजीगत	रू. ३४ करोड ५९ लाख	रू. ३० करोड ८२ लाख ४५ हजार	८९.११ %
	प्रदेश	चालु	रू. २५ लाख २ हजार	रू. २५ लाख २ हजार	१०० %
		पुँजीगत	रू. १ करोड १० लाख	रू. १ करोड १० लाख	१०० %
समपुरक अनुदान	सङ्घ		रू. ६८ लाख	रू. २४ लाख	३५.२९ %
	प्रदेश		रू. ७० लाख	रू. ७० लाख	१०० %
विशेष अनुदान	सङ्घ		रू. ५ करोड ६३ लाख	रू. ५ करोड ६३ लाख	१०० %
	प्रदेश		-	-	-
राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त	सङ्घ		रू. १६ करोड १७ लाख ११ हजार २९६	रू. १५ करोड ५७ लाख ३८ हजार ८६८	९६.३० %
	प्रदेश		रू. १ करोड ७० लाख ३१ हजार ७९९	रू. १ करोड ५७ लाख ३९ हजार ९० रूपैयाँ ३८ पैसा	९२.४१%
	स्थानीय		रू. २३ करोड ८० लाख ३० हजार ८५ रूपैया	रू. १३ करोड ५३ लाख ३ हजार ७११ रूपैया ४८ पैसा	५६.८४%
रोयल्टी (बन रोयल्टी-सङ्घ)			रू. ३५ लाख	रू. १८ लाख ९० हजार ४६ रूपैयाँ ३० पैसा	५४%
आन्तरिक स्रोत (स्थानीय तहको राजस्व अधिकार भित्रको मात्र)			रू. १६ करोड	रू. १५ करोड ९७ लाख २४ हजार ७५६ रूपैया ३० पैसा	९९.८५%
अ.ल्या. (बहुवर्षे आयोजना/कार्यक्रम र भुक्तानी बाँकी सहित)			रू. २९ करोड २१ लाख ७४ हजार ३८२	रू. ४७ करोड ५३ लाख ८३ हजार ७९७	-
उपभोक्ता/लाभग्राही/अन्य विविध नगद साझेदारी			रू. २ करोड	रू. २ करोड २७ लाख ६३ हजार ८३१	११३.८२%

आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को खुद आम्दानी र खर्चको विवरण

स्रोतको किसिम			खुद प्राप्त भएको	खर्च	खर्च प्रतिशत
वित्तीय समानीकरण अनुदान	सङ्घ		रु. १८ करोड ७० लाख १५ हजार २५०	रु. ७ करोड ६६ लाख ३ हजार ६४६	४०.९६ %
	प्रदेश		रु. १ करोड ९३ लाख १४ हजार	रु. ८४ लाख ८८ हजार ८९२	४३.९५%
सशर्त अनुदान	सङ्घ	चालु	रु. ३७ करोड ९५ लाख ३१ हजार	रु. ३४ करोड ९३ लाख १८ हजार ३०५	९२.०४ %
		पुँजीगत	रु. ३० करोड ८२ लाख ४५ हजार	रु. १८ करोड ६९ लाख ७ हजार ७२४	६०.६३ %
	प्रदेश	चालु	रु. २५ लाख २ हजार	रु. १५ लाख ९७ हजार २२५	६३.८४ %
		पुँजीगत	रु. १ करोड १० लाख	रु. ८६ लाख १६ हजार २९४	७८.३३ %
समपुरक अनुदान	सङ्घ		रु. २४ लाख	रु. २० लाख	८३.३३%
	प्रदेश		रु. ७० लाख	रु. २८ लाख ८५ हजार ८ रूपैया	४१.२१ %
विशेष अनुदान	सङ्घ		रु. ५ करोड ६३ लाख	रु. २ करोड ९१ लाख ६५ हजार ८२७	५१.८० %
	प्रदेश		-	-	-
राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त	सङ्घ		रु. १५ करोड ५७ लाख ३८ हजार ८६८	रु. ११ करोड १० लाख ५८ हजार ८४६	७१.३१ %
	प्रदेश		रु. १ करोड ५७ लाख ३९ हजार ९० रूपैया ३८ पैसा	रु. ६१ लाख ६१ हजार ६२२	३९.१५ %
	स्थानीय		रु. १३ करोड ५३ लाख ३ हजार ७११ रूपैया ४८ पैसा	रु. २ करोड ५७ लाख ७ हजार ५४०	१८.९९%
रोयल्टी (बन रोयल्टी-सङ्घ)			रु. १८ लाख ९० हजार ४६ रूपैया ३० पैसा	-	-
आन्तरिक स्रोत (स्थानीय तहको राजस्व अधिकार भित्रको मात्र)			रु. १५ करोड ९७ लाख २४ हजार ७५६ रूपैया ३० पैसा	रु. २६ करोड ७९ लाख ६० हजार ५७५	५९.३० %
अ.ल्या. (बहुवर्षे आयोजना/कार्यक्रम र भुक्तानी बाँकी सहित)			रु. २९ करोड २१ लाख ७४ हजार ३८२		
ऋण (नगर विकास कोष मार्फत प्राप्त)२०८३ असार मसान्त)			रु. ४ करोड ८३ लाख ४८ हजार ३२२	-	-

विषयक्षेत्रगत विनियोजन र खर्चको अवस्था (आ.व. २०८२/०८३)

क्र.सं.	विषय क्षेत्र	वार्षिक विनियोजित बजेट		खर्च रकम		खर्च प्रतिशत		कैफियत
		चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	
१	आर्थिक विकास (बजेट विनियोजनको भार – २.२१)	रु. ४ करोड २९ लाख ६४ हजार ७७९	रु. -	रु. २ करोड ४२ लाख ९३ हजार २५०	रु. -	५६.५४ %	-	
२	सामाजिक विकास (बजेट विनियोजनको भार – ३०.१४)	रु. ५८ करोड ५० लाख ७६ हजार ४५०	रु. -	रु. ४४ करोड ४४ लाख ६९ हजार २९७	रु. -	७६.१६ %	-	
३	पूर्वाधार विकास (बजेट विनियोजनको भार – ५०.५३)	रु. -	रु. ९८ लाख १० हजार ३६ हजार ५६२	रु. -	रु. ३८ करोड ४५ लाख ८४ हजार ३५२	-	३९.२० %	
४	वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन (बजेट विनियोजनको भार – १.११)	रु. २ करोड १५ लाख ०९ हजार २२९	रु. -	रु. ९४ लाख ८३ हजार २०२	रु. -	४४.०८ %	-	
५	सुशासन तथा संस्थागत क्षमता विकास (बजेट विनियोजनको भार – १.१६)	रु. २ करोड २५ लाख ७० हजार	रु. -	रु. १ करोड २० लाख ३६ हजार ६७९	रु. -	५३.३३ %	-	
६	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च (बजेट विनियोजनको भार – १४.८५)	रु. २८ करोड ८३ लाख ७८ हजार ५५०	रु. -	रु. २१ करोड ६१ लाख ८५ हजार ३११	रु. -	७४.९७ %	-	
७	वित्तीय व्यवस्थापन (०.३३)	रु. ६५ लाख		रु. ६५ लाख		१००%		
	जम्मा (वित्तीय व्यवस्थापन सहित) भर (चालु-४४.९४, पूँजीगत-५४.७३ र वित्तीय – ०.३३)	रु. ८७ करोड २४ लाख ७० हजार ७१६	रु. १ अर्ब ६ करोड २५ लाख ६४ हजार ८४६/३०	रु. ६६ करोड १६ लाख ४८ हजार १ रूपैयाँ ८ पैसा	रु. ४२ करोड ४० लाख ०४ हजार ८३ रूपैयाँ ९३ पैसा	७५.८३ %	३९.९० %	औषत खर्च – ५६.२५%

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मुख्य उपलब्धीहरू

सि. नं	सूचक	आ.व. २०८२/०८३ को प्रगति
१	स्थानीय तह भित्र निर्मित स्थानीय सडक (कालोपत्रे) - मिटरमा	3937
२	स्थानीय तह भित्र निर्मित स्थानीय सडक (पेवल्स लगाउने) - मिटरमा	7026.55
३	स्थानीय तह भित्र निर्मित स्थानीय सडक (उच्चस्तरीय ग्राभेल) - मिटरमा	1443
४	स्थानीय तह भित्र निर्मित स्थानीय सडक (कालोपत्रे मर्मत) - मिटरमा	0
५	स्थानीय तह भित्र निर्मित स्थानीय सडक (ड्रेन निर्माण) - मिटरमा	1899
६	स्थानीय तह भित्र निर्मित स्थानीय सडक (एजिङ्ग निर्माण) - मिटरमा	26461.1
७	स्थानीय तह भित्र निर्मित स्थानीय सडक (ग्रभेल/मिक्स गिट्टी) - मिटरमा	14370
८	नदि नियन्त्रण/तटबन्धन – मिटरमा	201
९	खानेपानीको पाइप खरिद/विस्तार – मिटरमा	0
१०	खानेपानीको धारा जडान – संख्यामा	131
११	कृषि बाध/पैनी/कुलो निर्माण – मिटरमा	193
१२	सिंचाईको लागि स्यालो टुवेल/बोरिङ जडान – संख्यामा	64
१३	कल्भर्ट निर्माण – संख्यामा	3
१४	विद्यालय भवन निर्माण – संख्यामा	4
१५	सार्वजनिक/सामुदायिक भवन निर्माण – संख्यामा	3

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मुख्य उपलब्धीहरू

सि. नं	सूचक	आ.व. २०८२/०८३ को प्रगति
१६	कंक्रीट फलैचा (कंक्रीटबाट बनेको बस्ने मेच) – संख्यामा	53
१७	सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय निर्माण – संख्यामा	3
१८	कृषि बजार टहरा निर्माण – संख्यामा	0
१९	सार्वजनिक/सामुदायिक सम्पत्तीको संरक्षण/घेरावारा – मिटरमा	1142.4
२०	सार्वजनिक/सामुदायिक सम्पत्तीको मर्मत सम्भार	13
२१	सडक बत्ती जडान – संख्यामा	0
२२	मन्दिर/गुम्वा/साकेला थान लगायतका धार्मिक स्थान निर्माण	5
२३	प्रवेशद्वार/गेट निर्माण – संख्यामा	1
२४	ह्युमपाइप खरिद तथा जडान – संख्यामा	7
२५	विजुलीको पोल/तार खरिद तथा जडान – संख्या/मिटरमा	16
२६	अन्य निर्माण कार्य.....	2

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मुख्य उपलब्धीहरू

सि. नं	सूचक	आ.व. २०८२/०८३ को प्रगति
१	सिंचाई सुविधा पुगेको जमिनको क्षेत्रफल (हेक्टर)	$४,८१० + ३०० = ५,११०$ हेक्टर
२	स्थानीय तहमा दर्ता/सूचीकृत भएका उद्योग/फार्मको संख्या	५,१६६ वटा
३	सामुदायिक विद्यालयको (माथिल्लो तहमा भर्ना हुन योग्य हुनेगरी) SEE उत्तिर्ण दर (आ.व. २०८१/०८२ मा ५९.२०% रहेको)	७८.७१%
४	आधारभूत तहको खानेपानी पुगेको घरधुरी प्रतिशत	१०० %
५	आधारभूत तहको सरसफाई पुगेको घरधुरी प्रतिशत	९९ %
६	रोजगार सूचना केन्द्रमा सूचीकृत वेरोजगारको संख्या (आ.व. २०८२/०८३ को अन्त्यसम्ममा)	१४५

बजेटको आधारमा:

स्वीकृत आयोजना/कार्यक्रमको विवरण

क्र.सं.	बिबरण	आ.व. २०८२/८३ को आयोजना संख्या
१.	२० लाख भन्दा बढी बजेटको आयोजना	१७
२.	१०+ देखि २० लाखसम्मको बजेटको आयोजना	३६
३.	५+ देखि १० लाखसम्मको बजेटको आयोजना	१०८
४.	१+ देखि ५ लाखसम्म बजेटको आयोजना	१६१
५.	१ लाख भन्दा कम बजेटका आयोजना	१८
	जम्मा	३४०

कार्यान्वयन तह/क्षेत्रको आधारमा:

क्र.सं.	बिबरण	आ.व. २०८२/८३ को आयोजना संख्या
१.	नगरपालिका स्तरीय	१८१
२.	वडास्तरीय	१५९
	जम्मा	३४०

आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि:

क्र.सं.	बिबरण	आ.व. २०८२/८३ को आयोजना संख्या
१.	उपभोक्ता समिति मार्फत	२४४
२.	निर्माण व्यवसायी मार्फत (NCB-23,SQ-26,DP-31)	८०
३.	बिद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत	८
४.	अन्य विधि मार्फत	८
५.	जम्मा	३४०

बहुवर्षिय आयोजना तथा कार्यक्रम र समस्याग्रस्त आयोजनाको विवरण

आ.व. २०८२/०८३ बाट दायित्व सरे बहुवर्षे आयोजना तथा कार्यक्रमको विवरणः

क्र.सं.	आयोजना तथा कार्यक्रमको विवरण	कार्यान्वयन अवधि (आ.व. २०..../... देखि २०८.../...)	कुल लागत	लागत साझेदारी			हाल कार्यान्वयनको अवस्था
				संघ	प्रदेश	स्थानीय	
१	Construction of Blacktopped Road Baggulal Khawas ko Ghar Dekhi Pipal chowk-khadam tole Mandal shrestha ko Ghar Samma Road and Sangeet Chowk to Tulashi Thapa Home Road, Sundarharaicha-01 SHM/NCB/W/24/2082/083	2082/083 to 2083/084	1,59,61,842.06	संघ	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।
२	Blacktopped Road Construction of Jholunge Pool Purba Uttar Road,Sundarharaicha 03 SHM/NCB/W/25/2082/083	2082/083 to 2083/084	1,47,22,222.22	-	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।
३	Asphalt Concrete Works 1.From IT College to Panchbighe Landfill Site, 2.Munal Marga and 3. Habeli U Marga, Sundarharaincha 04 SHM/NCB/W/44/2082/083	2082/083 to 2083/084	2,27,49,297.96	-	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।
४	Blacktopped Road Construction of Basbari Amarjyoti Chowk Dekhi Baliya Jodne Sadak Tatha Gurung toll Dekhi Namuna Toll Hudai Hasina Samma Road,Sundarharaicha 05 SHM/NCB/W/26/2082/083	2082/083 to 2083/084	1,61,27,751.23	-	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।
५	Blacktopped Road Construction of Gurung Tole Dekhi Dhankute Tole Hudai Jungle TathaJulebi Chowk Dekhi BisobidhyalayaJane Road, Sundarharaicha 06 SHM/NCB/W/27/2082/083	2082/083 to 2083/084	1,50,99,999.98	-	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।
६	Road Construction Work of Malati Marga, Sundarharaicha-07 SHM/NCB/W/30/2082/083	2082/083 to 2083/084	1,02,44,444.44	-	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।
७	Construction of Blacktopped Road, Laying of Interlocking Cement Concrete Block on Aananta Pokhrel Ghar Utar Aadarsha Tole Hudai Ujjyalo Tole Samma Sadak and Poudel tole Utar Bishwobidhyalaye Samma Ko Sadak, Sundarharaicha-8 SHM/NCB/W//31/2082/083	2082/083 to 2083/084	2,19,54,834.37	-	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।

बहुवर्षिय आयोजना तथा कार्यक्रम र समस्याग्रस्त आयोजनाको विवरण

क्रमश..... आ.व. २०८२/०८३ बाट दायित्व सरे बहुवर्षे आयोजना तथा कार्यक्रमको विवरण:

क्र.सं.	आयोजना तथा कार्यक्रमको विवरण	कार्यान्वयन अवधि (आ.व. २०..../... देखि २०८.../...)	कुल लागत (रु.मा)	लागत साझेदारी			हाल कार्यान्वयनको अवस्था
				संघ	प्रदेश	स्थानीय	
८	Construction of Asphalt concrete and Laying Paving Block on Different Roads of Sundarharaicha 9 & 10 SHM/NCB/W/52/2082/083	2082/083 to 2083/084	5,80,02,098.13	-	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।
९	Blacktop Road and Protection Wall Construction Work (1.Sukrabare-Govindapur Road 2.Dhati Tol ko Purano Sadak 3.Raj Tol Sadak 4.Tin Paini Dekhi Pashchim Road), Sundarharaicha-11 SHM/NCB/W/61/2082/083	2082/083 to 2083/084	1,99,99,223.58	-	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।
१०	Bituminous Asphalt Road and Interlocking block road Construction Work, Sundarharaicha 12 SHM/NCB/W/28/2082/083	2082/083 to 2083/084	1,52,00,208.25	-	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।
११	Office Building Construction of Ward Office 07	2082/083 to 2083/084	2,00,00,000	-	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।
१२	Construction of Blacktop Road and Laying Pabbles (Block) in Different Roads,Sundarharaincha 09,10&12 SHM/MOR/NCB/W/-12 - 2079/080	2082/083 to 2083/084	69,09,406.14	-	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।
१३	Street Lighting Works with Phase Addition and Pole Erection, Ward 10 Baghjoda Simsar to Ward 5 Hasina Simsar SHM/MOR/NCB/W/55/2081/082	2081/082 to 2083/084	44,00,820.5	-	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।

बहुवर्षिय आयोजना तथा कार्यक्रम र समस्याग्रस्त आयोजनाको विवरण

क्रमश..... आ.व. २०८२/०८३ बाट दायित्व सरे बहुवर्षे आयोजना तथा कार्यक्रमको विवरण:

क्र.सं.	आयोजना तथा कार्यक्रमको विवरण	कार्यान्वयन अवधि (आ.व. २०..../... देखि २०८.../...)	कुल लागत (रु.मा)	लागत साझेदारी			हाल कार्यान्वयनको अवस्था
				संघ	प्रदेश	स्थानीय	
१४	Construction Works of School Building of Mahendra Ma. Vi., Sundarharaincha 11 SHM/NCB/W/16/2082/083	2082/083 to 2083/084	34,69,176.49	संघ	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।
१५	Construction of School Building of Shree Jyoti Ma. Vi., Sundarharaincha 06 SHM/NCB/W/17/2082/083	2082/083 to 2083/084	40,93,311.35	संघ	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।
१६	Construction Works of School Building of Sajilal Ma. Vi. (Gachhiya Block), Sundarharaincha 07 SHM/NCB/W/19/2082/083	2082/083 to 2083/084	35,22,438.28	संघ	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।
१७	Construction of Interlocking block Road (Road no 25 and 02), Sundarharaincha 12 SHM/NCB/W/32/2082/083	2082/083 to 2083/084	47,80,420.82	-	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।
१८	Blacktopped Road Maintenance Works, Belepur-Sukrabare, Sundarharaincha 11 and 12 SHM/NCB/W/33/2082/083	2082/083 to 2083/084	1,01,45,491.62	-	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।
१९	Slab Culvert Construction Works of Beldangi-Malati Kishan lal Chaudhary House Near. Sundarharaicha 02 SHM/NCB/W/34/2082/083	2082/083 to 2083/084	30,04,275.83	-	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।

बहुवर्षिय आयोजना तथा कार्यक्रम र समस्याग्रस्त आयोजनाको विवरण

क्रमश..... आ.व. २०८२/०८३ बाट दायित्व सरे बहुवर्षे आयोजना तथा कार्यक्रमको विवरण:

क्र.सं.	आयोजना तथा कार्यक्रमको विवरण	कार्यान्वयन अवधि (आ.व. २०..../... देखि २०८.../...)	कुल लागत (रु.मा)	लागत साझेदारी			हाल कार्यान्वयनको अवस्था
				संघ	प्रदेश	स्थानीय	
२०	Construction of Naya Brindaban Gaushala Jestha Nagarik Dharmashala, Sundarharaicha 05 SHM/NCB/W/42/2082/083	2082/083 to 2083/084	10,25,623.62	-	प्रदेश	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।
२१	Nagar Hospital Compound Wall Construction Works, Back Filling Works, and Other Miscellaneous Works SHM/NCB/W/56/2082/083	2082/083 to 2083/084	1,19,95,630.75	-	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।
२२	Construction Work of Protection Wall (Koiri Danda Sadak & Bhuwaneshwor Marga) and Ward Office Compound Wall, Sundarharaicha-11 SHM/NCB/W/62/2082/083	2082/083 to 2083/084	47,20,253.95	-	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।
२३	Laying of Cement Concrete Interlocking Block on Safal Siddhartha Academy way road Sundarharaicha 08 SHM/NCB/W/72/2082/083	2082/083 to 2083/084	26,82,943.11	-	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।
२४	Construction of Administrative Building of Nagar Hospital, Sundarharaicha-1 (SHM/MOR/NCB/W/17/2081/082)	2081/082 to 2083/084	6,51,53,880.04	संघ	-	स्थानीय	कार्यान्वयन/काम भई रहेको ।

बहुवर्षिय आयोजना तथा कार्यक्रम र समस्याग्रस्त आयोजनाको विवरण

समस्याग्रस्त आयोजना/कार्यक्रमको विवरण:

क्र.सं.	आयोजना तथा कार्यक्रमको विवरण	कार्यान्वयन शुरू भएको बर्ष	हाकको अवस्था	जम्मा लागत (रु.मा)	स्रोत
१	Construction of Hasina Simsar Park Works, Sundarharaicha-05 (SHM/MOR/NCB/W/51/2077/78)	2077/078	- जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा रहेको - केन्द्रले बजेट नपठाएको भएर हाललाई म्यादथप नभएको	5,39,74,081.9	संघ र स्थानीय
२	Black Top Road Construction Work Of Laxmipur - Haraincha-Sagarmatha Chowk Road and Kumar Gaun Road Sundarharaincha 01 (SHM/MOR/NCB/W/22/2078/079)	2078/079	पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्तिको समयमा पनि कार्यसम्पन्न नभएकोले कार्यसम्पादन जमानत जफत गरिएको , कालोसूचिको लागि सिफारिस गरिएको	1,47,48,597.1	स्थानीय
३	Black Top Road Construction Work Of Salakpur - Paccham Road Sundarharaincha 10 , 11 (SHM/MOR/TMPP/NCB/W/23/2078/079)	2078/079	पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्तिको समयमा पनि कार्यसम्पन्न नभएकोले कार्यसम्पादन जमानत जफत गरिएको, कालोसूचिको लागि सिफारिस गरिएको	1,37,76,030.1	स्थानीय
४	Blacktop Road Construction Works Of Dhati Bhutahi tole Hulaki Marga Road Sundarharaicha -02,11 (SHM/MOR/NCB/W/31/2078/079)	2078/079	पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्तिको समयमा पनि कार्यसम्पन्न नभएकोले कार्यसम्पादन जमानत जफत गरिएको , कालोसूचिको लागि सिफारिस गरिएको	1,49,28,312.8	स्थानीय
५	Construction of Blacktop Roads, Sundarharaicha 02, 07, 9 and 10 (SHM/MOR/NCB/W-7/2079/080)	2079/080	१ पटक म्यादथप हुदाँ नि कार्यसम्पन्न नभएको र निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा नआएकोले कार्यसम्पादन जमानत जफत गरिएको	67,51,976.8	स्थानीय
६	Interlocking Block Road Construction Works of Bangali Tole to Ram Aa.Bi.Road Sundarharaicha 09 & Jestha Nagarik Marga Sundarharaicha 10 (SHM/MOR/NCB/W-43/2080/081)	2080/081		37,50,846.87	स्थानीय

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पादित उल्लेखनिय मुख्य मुख्य कार्यहरु

- मिति २०८२/०५/२४ गते Gen-Z पुस्ताको आन्दोलन, अगजनी तथा तोडफोडबाट नगरपालिकाको २ वटै प्रशासनीक भवन क्षति भएकोमा सो मर्मत गरी पुनः उक्त भवनबाट सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको,
- वडा नं. १ मा रहेको सुन्दरहरैँचा नगर अस्पतालको प्रशासनीक भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको,
- विश्व बैंकको सहयोगमा NUGIP सँगको सहकार्यमा वडा नं. ६, ७ र ८ मा ९.७४ कि.मी. दुवै तर्फ नाल, बत्ती सहितको फराकिलो कालोपत्र सडक निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको (भौतिक प्रगति – ९२ % सम्पन्न भएको),
- भारत सरकार र सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको सहलगानी/साझेदारीमा वडा नं. ७ गोठगाउँमा पञ्चायत मा.वि. को भवन निर्माण भई हस्तान्तरणको चरणमा रहेको,
- फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने कार्य (PPP Model मा लैजाने) भएको,
- बैकल्पिक उर्जा काठमाडौँसँगको सहलगानी/साझेदारीमा २७६ जनालाई सुधारिएको तह ३ को चुल्लो वितरण गरिएको,
- सिचाई सुविधा बिस्तार गर्ने उद्देश्यले कृषकहरूसँगको सहकार्य/साझेदारीमा – ५९ थान स्यालो टुबेल गडान तथा जडान गरिएको,
- आ.व. २०८२/०८३ मा सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ दफा ५(३) अनुसार स्वतः प्रकाशनको हुने गरेको,
- उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन हुने रु. १० लाख सम्मका आयोजनको सम्झौता तथा भुक्तानी सिफारिस सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट नै हुने गरेको,
- घर नक्साको कार्य Online प्रणालीबाट घरनक्सा पास तथा अभिलेखिकरण हुने गरेको,
- भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बासोबासीहरूमध्ये वडा नं. ८ विश्वविद्यालय दक्षिण क्षेत्रमा ४१ जना र वडा नं. १० गौरीटोल तथा बाघझोडा टोलका ४७ जना गरी जम्मा ८८ जना घरपरिवारलाई भूमि आयोगमार्फत जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरिएको,
- आ.व. २०८२/०८३ र २०८३/०८४ मा कार्यान्वयन गर्ने/निर्माण गर्ने गरी प्रत्येक वडाले रु. २ करोडका ठुला आयोजना कार्यान्वयन गर्न ११ वटामा आयोजना छनौट भई निर्माणको चरणमा रहेका,
- कोशी प्रदेश सरकार PLGSP र सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको साझेदारी/सहलगानीमा IPP कार्यक्रम मार्फत Smart Urban Governance को कार्य अगाडि बढाइएको,
- निर्णय प्रक्रियामा बालबालिका तथा युवाहरूको सहभागिता बढाउँदै लगेको,
- प्रविधि मैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यको थालनी गरीएको ।
- गौरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण तथा सुरक्षाका लागि पालिका क्षेत्रभित्र २७ ठाउँमा CC Camera जडान गरिएको,

क्रमश.....आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पादित उल्लेखनिय मुख्य मुख्य कार्यहरु

- घरनक्साका पुराना फाइल/कागजात तथा कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत विवरण रहेको फाइललाई Digitization गर्ने गरी करिव ७ हजार फाइल/कागजातको Scan गरी प्रणालीमा आवद्ध गर्न थालिएको,
- LDTA ललितपुरसँगको समन्वयमा अधिकृतस्तर छैठौं तहका ३० जना कर्मचारीहरुलाई ३२ कार्यदिन सेवाकालिन तालिम आयोजना गरिएको,
- ५० % अनुदानमा उन्नत जातको धनको विउ २१,६२८ के.जी. वितरण गरिएको,
- सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको आयोजनामा वृहत शैक्षिक मेलाको आयोजना भएकोमा सो मेलामा करिव १ लाखले अध्ययन/अवलोकन भ्रमण गरेको,
- ३० वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरुको नसर्ने रोग बारेको ६,७९८ जना स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको जसमध्ये ३९१ जना व्यक्तिलाई उपचारको लागि रेफर गरिएको,
- ११ वटा समुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी/शिक्षकहरुमध्ये ५५० जनालाई लागु औषधी दुर्वेसनियविरुद्ध जागरणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको,

उल्लेखनिय कार्यहरु मध्ये अनुकरणीय कुनै एक अभ्यासको विस्तृतीकरण

विषयको शीर्षक (असल अभ्यासको नाम): बालमैत्री शासन स्थापना तथा सञ्चालन

पूर्व अभ्यास तथा अनुभव:

- ▶ शासनमा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिताको विषयलाई सामान्य रुपमा लिने गरेको ।

परिवर्तन गरिएको मुख्य पक्षहरु:

- ▶ बालमैत्री शासन सञ्चालनका लागि देहायका कानून निर्माण गरिएको;
 - ▶ बालमैत्री स्थानीय शासन तथा बाल अधिकार संरक्षण कार्यविधि, २०८२
 - ▶ बालमैत्री आचरसंहिता, २०८२
 - ▶ बालकोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८२
- ▶ नगरस्तरीय बाल सञ्जाल गठन,
- ▶ वडास्तरीय बाल क्लब गठन,
- ▶ बालबालिका उपक्षेत्रतर्फ आ.व. २०८२/०८३ मा रु. ५७ लाख बजेट विनियोजन भएको,
- ▶ वडा नं. १ देखि वडा नं. ६ सम्मका वडाहरूको बाल प्रोफाइल तयार गरिएको,

उल्लेखनिय कार्यहरु मध्ये अनुकरणीय कुनै एक अभ्यासको विस्तृतीकरण

क्रमश.....

मुख्य सिकाई:

- ▶ शासन सञ्चालनमा Gen-Z उमेरका पुस्ताको समेत अर्थपूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न सकिने/हुने,

भावी योजना:

- ▶ आ.व. २०८३/०८४ मा वडा नं. १ देखि वडा नं. ६ सम्मका वडाहरूलाई बालमैत्री वडा घोषणा गर्ने,
- ▶ आ.व. २०८३/०८४ मा वडा नं. ७ देखि वडा नं. १२ सम्मका वडाहरूको डिजिटल वाल प्रोफाइल तयार गर्ने,
- ▶ आ. व. २०८४/०८५ मा सुन्दरहरैँचा नगरपालिकालाई बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्ने,
- ▶ बालउद्यान केन्द्र निर्माण/बालउद्यान पुस्ताकलय निर्माण लगतको कार्य गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको,

स्थानीय तहले अनुभूत गरेका प्रमुख समस्या

- संघीय सरकार/प्रदेश सरकारबाट दिएको सिलिङ्ग अनुसार बजेट निकास नहुने गरेको,
- संघीय सरकार/प्रदेश सरकारबाट नै कार्यान्वय हुने गरी छनौट भएका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा समन्वय नहुने गरेको,
- स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्दाको समयमा दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी समायोजन गरी पठाईएको तर हाल उक्त दरबन्दी भन्दा बढी रहेका कर्मचारीहरूको तलबका लागि बजेट निकास समस्या हुने गरेको,
- भौतिक पूर्वाधारको काममा निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नसक्ने प्रवृत्ति (कानुनी प्रक्रियामा लैजान खोज्दा लामो समय लाग्ने),
- फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल्ड/डम्पिङ्ग साईट/प्रसोधन केन्द्र व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको,
- नदिजन्य पदार्थको उत्खन्न तथा बिक्री (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम प्रदेश सरकारको हिस्सा ४० % रहने भएता पनि राजस्व संकलन गर्ने प्रणाली विकास गर्न प्रदेश सरकार मौन रहने गरेको ।

जिल्ला समन्वय समिति मोरङसँग अपेक्षा

- ▶ जिल्लामा रहेका पालिकाहरूको महिनामा एक पटक बैठक राखी जल्दावाल्दा समस्याहरूको छलफल गरी त्यसको उचित निराकरण गर्न समन्वय बैठकको आयोजना गर्ने,
- ▶ जिल्लामा रहेका पालिकाहरूका समस्या, अवश्यकता तथा असल अभ्यासको आवाज माथिल्लो तहमा पुऱ्याउने,
- ▶ विपद् व्यवस्थापन (भूकम्प, बाढी, महामारी आदि) मा एकिकृत प्रणालीको विकास गरी सोहि अनुसार एकद्वार प्रणालीलाई सक्रिय बनाउने माथिल्लो तहमा पुऱ्याने,
- ▶ नदिज्य पदार्थको उत्खन्न, बिक्री वितरण लगायतका विषयमा नियमित अनुगमन गरी पालिकालाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराइदिन पर्ने,
- ▶ संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने/गराउने,
- ▶ जिल्ला भित्रका एक भन्दा बढी पालिका जोड्ने बाटो, पुल निर्माण जस्ता भौतिक निर्माण गर्ने कार्यमा समन्वय गर्ने,
- ▶ जिल्ला भित्रका पालिकाहरूको तथ्याङ्क संकलन, विश्लेषण तथा व्यवस्थापन गर्ने ।

कोशी प्रदेश सरकारसँग अपेक्षा

- ▶ पालिका रहेका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्ने, (तालिम तथा प्रशिक्षणको माध्यमबाट),
- ▶ भूमि प्रशासन सम्बन्धी विषय तीनै तहका सरकारको राजस्व संकलनको स्रोत भएको हुँदा नगरपालिकामा स्थापना हुने भूमि व्यवस्थापन कार्यमा आवश्यक समन्वयम क्षमता विकास,
- ▶ स्थानीय आवश्यकताका आधारमा आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरी समयमै बजेट निकासी गर्ने प्रणाली,
- ▶ संविधान र संघीय कानून प्रतिकूल हुने कानून निर्माण/प्रदेशले गर्ने निर्णय स्थिर हुने, (बन पैदावार बिक्रिको आम्दानीका आधारमा १०% स्थानीय सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व (बिक्रि Vs. नाफा), ई रिक्शा व्यवस्थापन),
- ▶ नदिजन्य पदार्थको बिक्रिबाट प्राप्त गर्ने हिस्सामा प्रदेशको हिस्सा-४०% स्वतः प्राप्त हुने तर त्यसको बिक्रिका लागि गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था, संरचनागत व्यवस्था तथा समन्वयात्मक विषयमा समेत पन्चास सहयोग तथा सहकार्य,
- ▶ दिगो तथा सन्तुलित विकासका लागि समुचित स्रोतसाधनको परिचालन गर्ने/गराउने प्रणालीको विकास,
- ▶ संघीय सरकार र पालिका सरकारका विचको संवैधानिक भूमिकालाई थप प्रभावकारी हुने गरी काम गर्न पर्ने,
- ▶ पालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई थप चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

सङ्घीय सरकारसँग अपेक्षा

- ▶ समानिकरण अनुदान वपत प्राप्त हुने अनुदानको १००% रकम प्राप्त हुने सुनिश्चितता हुन पर्ने,
- ▶ भूमि व्यवस्थापन शाखा सञ्चालनको लागि जनशक्तिकको क्षमता विकास,
- ▶ आयोजना बैक निर्माण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा एकिकृत Digital प्रणालिको विकास,
- ▶ स्थानीय आवश्यकताका आधारमा आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरी समयमै बजेट निकास गर्न प्रणाली,
- ▶ पालिका रहेका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्ने, (तालिम तथा प्रशिक्षणको माध्यमबाट),
- ▶ सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने/गराउने विषयमा नेतृत्व दायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने,
- ▶ संविधानको अनुसूची-९ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा रहेका विषयहरूको यथासिद्ध कानून निर्माण भए स्थानीय सरकारले थप प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्य गर्ने,
- ▶ आयोजना तथा कार्यक्रमका बारे संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट के-कति रकम बराबरको विनियोजन हुन पर्ने सो को स्पष्ट मापदण्ड हुन पर्ने,
- ▶ फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने कार्य स्थानीय सरकारको एकल प्रयासबाट मात्र व्यवस्थापन गर्न गाह्रो पर्ने हुँदा संघीय सरकारले समेत सो कार्यमा सहजिकरण गरिदिन पर्ने,
- ▶ कानूनत नापी र मालपोत कार्यालय स्थानीय सरकार अन्तर्गत रहेको तर व्यवहारत हालसम्म पनि संघीय सरकार अन्तर्गत नै रहेको हुँदा यथासिद्ध तत् निकायलाई स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिदिन पर्ने,
- ▶ राजश्व बाँडफाँडको हिस्सामा पालिकाले प्राप्त गर्ने हिस्सा बढाउन पर्ने,
- ▶ सशर्त अनुदान मार्फत संघीय सरकारबाट प्राप्त अधिकांश आयोजना तथा कार्यक्रमको स्थानीय आवश्यकता भन्दा फरक हुने गरेको हुँदा सशर्त अनुदानको सट्टा समानिकरण अनुदानलाई बढाएर पठाउने ।

आ.व. २०८२/०८३ मा कार्यान्वयन भएका आयोजना/कार्यक्रमका फोटोहरू



योजना तथा अनुगमन शाखा सुन्दरहरैँचा न.पा., मोरङ

June 28 · 🌐

मिति २०८३/०३/१४ गते आइतबार
वडा नं ७



योजना तथा अनुगमन शाखा सुन्दरहरैँचा न.पा., मोरङ

July 7 · 🌐

सिसै बाँध करेवन जाने पैनी डून सहित मर्मत कार्य
सुन्दरहरैँचा - २
मिति २०८३/०३/२३ गते मंगलबार



आ.व. २०८२/०८३ मा कार्यान्वयन भएका आयोजना/कार्यक्रमका फोटोहरू



योजना तथा अनुगमन शाखा सुन्दरहरैँचा न.पा., मोरङ

July 5 · 🌐

वडा नं ४

मिति २०८३/०३/२२ गते सोमबार



योजना तथा अनुगमन शाखा सुन्दरहरैँचा न.पा., मोरङ

July 6 · 🌐

वडा नं १

मिति २०८३/०३/२२ गते सोमबार



आ.व. २०८२/०८३ मा कार्यान्वयन भएका आयोजना/कार्यक्रमका फोटोहरू



योजना तथा अनुगमन शाखा सुन्दरहरैँचा न.पा., मोरङ

July 8

वडा नं ५

मिति २०८३/०३/२४ गते बुधबार



योजना तथा अनुगमन शाखा सुन्दरहरैँचा न.पा., मोरङ

July 5

वडा नं १

मिति २०८३/०३/२२ गते सोमबार



July 8 • 

मिति २०८३/०३/२४ गते बुधवार

क्र.सं.	पद	नाम वार	जन्म तिथि	संविधान सं.	पदोन्नति
१.	उप-निरीक्षक	नेत्र भारवादा चौधरी	११/१२/२०२५	६५ वर्ष	सीट
२.	उप-निरीक्षक	विदेनारा चौधरी	११/१२/२०२५	६२ वर्ष	सीट
३.	उप-निरीक्षक	अशोक कुमार मिश्र	११/१२/२०२५	६० वर्ष	सीट
४.	उप-निरीक्षक	रविशंकर चौधरी	११/१२/२०२५	६० वर्ष	सीट
५.	उप-निरीक्षक	अशोक कुमार चौधरी	११/१२/२०२५	६० वर्ष	सीट
६.	उप-निरीक्षक	अशोक कुमार चौधरी	११/१२/२०२५	६० वर्ष	सीट
७.	उप-निरीक्षक	अशोक कुमार चौधरी	११/१२/२०२५	६० वर्ष	सीट
८.	उप-निरीक्षक	अशोक कुमार चौधरी	११/१२/२०२५	६० वर्ष	सीट
९.	उप-निरीक्षक	अशोक कुमार चौधरी	११/१२/२०२५	६० वर्ष	सीट
१०.	उप-निरीक्षक	अशोक कुमार चौधरी	११/१२/२०२५	६० वर्ष	सीट

[illegible]July 1 • 

मिति २०८३/०३/१७ गते बुधबार

सुतका घाटी सुन्दरहरैचा नगरपालिका		
आयोजनाको नाम	राजा किरण कुमारी सहकारी विकास संस्था सहकारी लॉड विंग सुताखो बजार जिला	
सञ्चालन स्थान	सुन्दरहरैचा नगरपालिका - १९ मोड	
उप को नाम	नव केन्द्र को सुताखो विंग उपस्थित लॉड विंग सुताखो बजार जिला खोरी बुद्धलेख	
समाप्ति तिथि	२०८२/१२/१० कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने मिति २०८३/०३/०२	
लाभान्विता अवसरहरूः	४३०० जना	
अनुमानित कुल लाभ		
नगरपालिका	लाभित सहभाजिता	जरूमा (रु.₹.)
६२५०००।-	१५३४८७।५५	७७८४८७।५५

[illegible]

सुपुत्रा पाटी
सुपुत्राहरण का नगरपालिका

अनुराधाका लाल रु. १०००/-
 लालका लाल रु. १०००/-
 ३ रु. को लाल रु. १०००/-
 लालका लाल रु. १०००/-

अनुमानित कुल लागत
 नगरपालिका रु. १०००/-
 अनुमानित खर्च रु. १०००/-


अनुमानित खर्च
 नगरपालिका रु. १०००/-
 अनुमानित खर्च रु. १०००/-

सुचना पानी
सुन्दरहरैण सगरमाथा

आयोजनाको नाम	तनू किशन कृषि सुकारी रिंग अण्डान सुकारी लॉ रिंग सुकारी अरन क्षेत्रांग
राज्यालय स्थान	सुन्दरहरैण काठमाडौण - ११ बोरु
उ.स. को नाम	तनू किशन कृषि सुकारी रिंग अण्डान सुकारी लॉ रिंग सुकारी अरन क्षेत्रांग
समाप्ती तिथि	२०८३/०९/०९ तनू किशन कृषि सुकारी रिंग अण्डान सुकारी लॉ रिंग सुकारी अरन क्षेत्रांग

[illegible]

आ.व. २०८२/०८३ मा कार्यान्वयन भएका आयोजना/कार्यक्रमका फोटोहरू

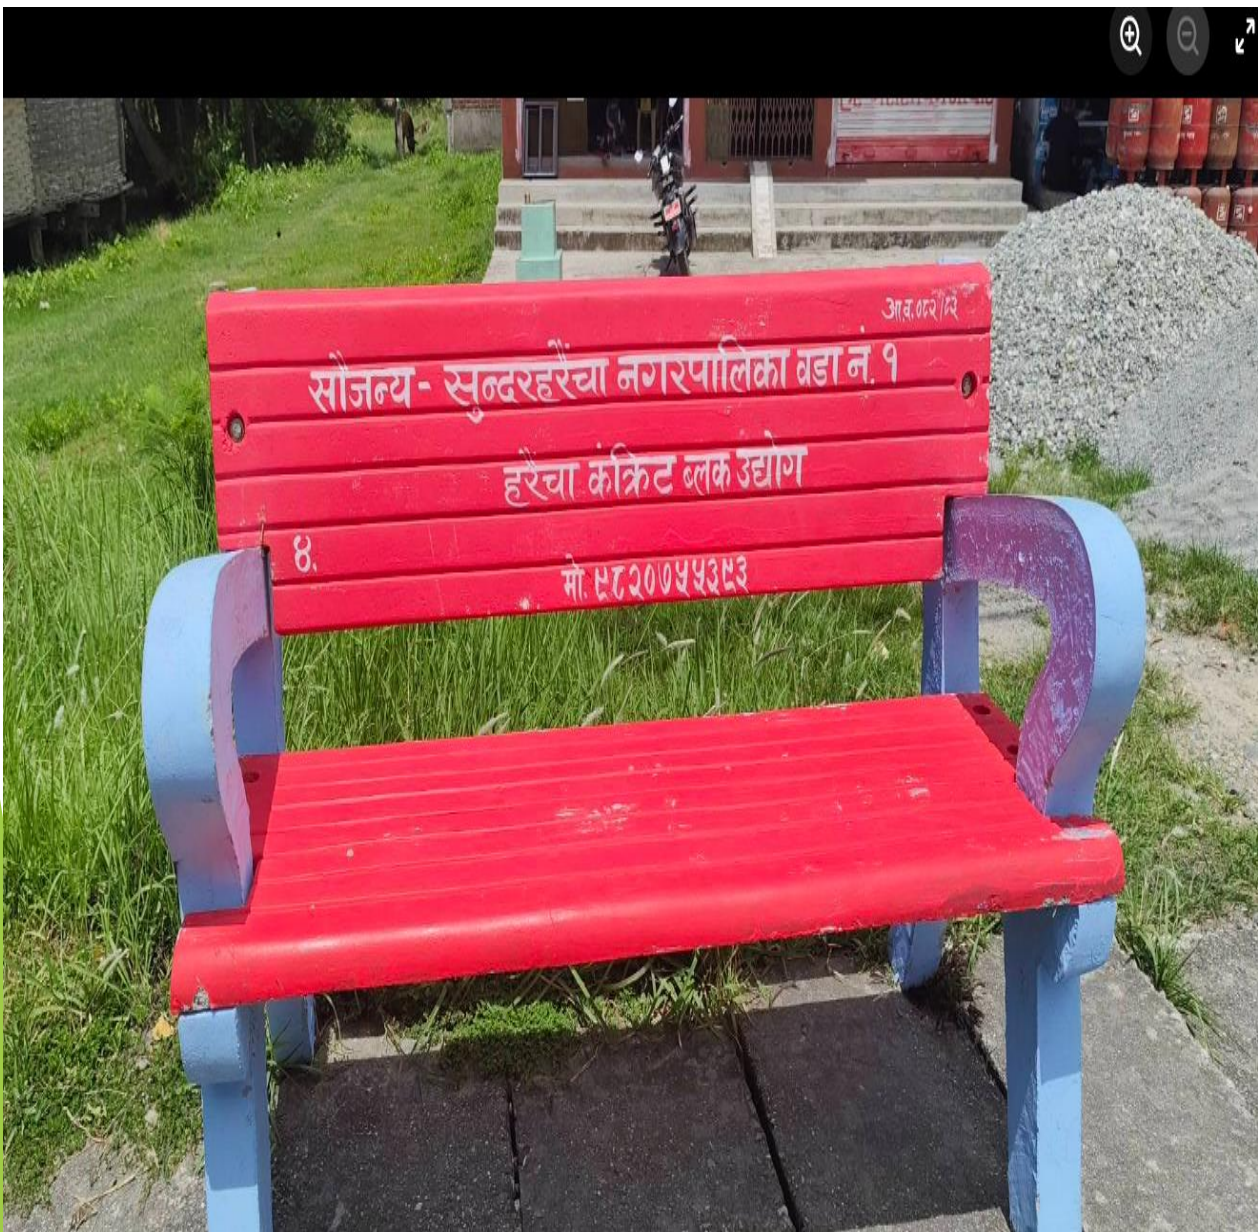


योजना तथा अनुगमन शाखा सुन्दरहरैँचा न.पा., मोरङ

July 2 · 🌐

वडा नं १२

मिति २०८३/०३/१९ गते शुक्रबार



धन्यवाद ।
